



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE - SESAB

TERMO ADITIVO Nº14 AO CONTRATO Nº030/2010

TERMO ADITIVO Nº14 AO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 030/2010 DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DO HOSPITAL DO SUBÚRBIO.

As partes abaixo qualificadas: de um lado,

(a) O **ESTADO DA BAHIA**, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, doravante denominada "SESAB", integrante da Administração Estadual direta, com sede em Salvador, Bahia, no Centro Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, 400, Lado B, neste ato representada pela Secretária Estadual da Saúde, Sra. ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA [REDACTED] devidamente autorizada pelo Decreto de Delegação s/nº, publicado no D.O.E, de 04 de Janeiro de 2023, e em conjunto com o Estado da Bahia, então denominado "**Poder Concedente**"; e de outro,

(b) **A PRODAL SAÚDE S/A**, sociedade por ações, com sede em Salvador, Estado da Bahia, na Rua Manoel Lino, nº141, Periperi, CEP nº40.726-390, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda, sob o nº. 11.943.553/0001-02, Inscrição Municipal nº339.919/001-02, neste ato devidamente representada por seu Diretor-Presidente Sr. JORGE ANTÔNIO DUARTE OLIVEIRA, brasileiro, casado, contador, [REDACTED] doravante denominada "**Concessionária**";

e, ainda, na qualidade de interveniente- anuente:

A AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A, doravante denominada "**Desenbahia**", pessoa jurídica de direito privado, constituída como sociedade anônima de capital fechado, conforme autorização da Lei Estadual nº2.321, de 11 de abril de 1966, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda, sob o nº15.163.587/0001-27, com sede em Salvador, Bahia, na Rua Ivonne Silveira, nº 213 - Doron, neste ato representada por seu Presidente, Sr. PAULO DE OLIVEIRA COSTA, [REDACTED] e do Diretor de Operações, Sr. MARKO SVEC SILVA, [REDACTED]

no âmbito do Contrato de Concessão Administrativa nº030/2010 ("Contrato"), cujo objeto é a gestão e operação do Hospital do Subúrbio;

CONSIDERANDO:

1. A necessidade de realização das obras voltadas à implantação 10 (dez) leitos de UTI neurológica, 34 leitos de enfermaria neurológica e reforma do setor da emergência do Hospital do Subúrbio, com vistas ao início da 2ª fase de operação da Unidade, para atendimento ao novo perfil assistencial, conforme previsto na Renovação Contratual (12º termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 030/2010).

Resolvem as Partes e o Interveniente-Anuente, de mútuo e comum acordo, celebrar o presente Termo Aditivo nº 14 ao Contrato, conforme o processo administrativo SEI nº 019.8743.2023.0068043-70, nos termos das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO POR RESSARCIMENTO

1.1 Os investimentos realizados pela Concessionária para a realização das obras necessárias para implantação de 10 (dez) leitos de UTI neurológica, 34 leitos de enfermaria neurológica e reforma do setor da emergência serão ressarcidos pelo Poder Concedente, no montante de R\$ \$ 6.766.096,97 (seis milhões setecentos e sessenta e seis mil, noventa e seis reais e noventa e sete centavos), valor em data-base de fevereiro/2023.

1.2 ☒ pagamento de que trata a subcláusula 1.1 será realizado de forma faseada, mediante disponibilização da infraestrutura de cada etapa das obras e serviços referidos na subcláusula 1.1, conforme cronograma que integra o Anexo Único deste aditivo, após fiscalização e aceite por agente designado pela SESAB, obedecendo o fluxo de pagamento estabelecido pela DESENBAHIA.

1.3 O ressarcimento previsto na subcláusula 1.1 remunera a Concessionária pelos investimentos realizados para a implantação dos 10 (dez) leitos de UTI neurológica, 34 leitos de enfermaria neurológica e pela reforma do setor da emergência, estabelecendo o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 As despesas decorrentes deste Termo Aditivo ocorrerão por conta dos recursos de dotação orçamentária a seguir especificada:

Unidade Gestora – 0083

Projeto/Atividade – 5328

Fonte – 0130

Elemento de Despesa - 4.5.67.83

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 Exceto se expressamente indicado ou definido de forma diversa neste Aditamento, os termos em maiúsculo aqui empregados terão os significados a ele respectivamente atribuídos no Contrato de Concessão.

3.2 Exceto pelo disposto neste Aditamento, as demais cláusulas do Contrato de Concessão permanecerão inalteradas, válidas e vinculantes em relação às Partes e Intervenientes- Anuentes, sendo neste ato plenamente ratificada.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente Termo Aditivo nº14 ao Contrato de Concessão, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, considerada cada uma delas um original.

Pela SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA

Cargo: Secretária da Saúde do Estado da Bahia

Pela PRODAL SAÚDE S/A

JORGE ANTONIO DUARTE OLIVEIRA

Cargo: Diretor Presidente

Pela AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A – DESENBAHIA (na qualidade Interveniente Anuente)

PAULO DE OLIVEIRA COSTA

Cargo: Presidente

MARKO SVEC SILVA

Cargo: Diretor de Operação

ANEXO ÚNICO

AO TERMO ADITIVO Nº 14 AO CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA Nº 030/2010

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

 JD CONSTRUTORA PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO  Hospital do Subúrbio											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Ago/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
1	REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO	100,00%	2,37%	12,78%	34,66%	33,30%	16,70%	0,18%	112 dias	Qua 09/08/23	Seg 08/01/24
2	SERVICOS CIVIS	47,79%	2,07%	2,19%	10,76%	21,76%	10,83%	0,18%	112 dias	Qua 09/08/23	Seg 08/01/24
3	ADMINISTRAÇÃO	4,35%	0,63%	0,87%	0,92%	0,88%	0,87%	0,17%	112 dias	Qua 09/08/23	Seg 08/01/24
4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,46%	0,08%	0,09%	0,10%	0,09%	0,09%	0,01%	109 dias	Qua 09/08/23	Qua 03/01/24
5	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGO	0,57%	0,08%	0,11%	0,12%	0,11%	0,11%	0,02%	109 dias	Seg 14/08/23	Seg 08/01/24
6	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLET	1,94%	0,28%	0,39%	0,41%	0,39%	0,39%	0,08%	109 dias	Seg 14/08/23	Seg 08/01/24
7	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLET	0,69%	0,10%	0,14%	0,15%	0,14%	0,14%	0,03%	109 dias	Seg 14/08/23	Seg 08/01/24
8	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLET	0,69%	0,10%	0,14%	0,15%	0,14%	0,14%	0,03%	109 dias	Seg 14/08/23	Seg 08/01/24
9	CANTEIRO DE OBRA	0,70%	0,12%	0,14%	0,15%	0,14%	0,14%	0,01%	109 dias	Qua 09/08/23	Qua 03/01/24
10	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	0,11%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	109 dias	Qua 09/08/23	Qua 03/01/24
11	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVE	0,09%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	109 dias	Qua 09/08/23	Qua 03/01/24
12	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANH	0,14%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	109 dias	Qua 09/08/23	Qua 03/01/24
13	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFETÓRIO SEM BANH	0,17%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,00%	109 dias	Qua 09/08/23	Qua 03/01/24
14	ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO ATÉ 500KG	0,19%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%	109 dias	Qua 09/08/23	Qua 03/01/24
15	SERVICOS PRELIMINARES/ SERVICOS INICIAIS	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6 dias	Qua 23/08/23	Qua 30/08/23
16	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6 dias	Qua 23/08/23	Qua 30/08/23
17	DEMOLICOES E RETIRADAS	1,00%	0,90%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20 dias	Ter 15/08/23	Seg 11/09/23
18	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM R	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 15/08/23	Seg 04/09/23
19	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM R	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 15/08/23	Seg 04/09/23
20	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E	0,43%	0,39%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 15/08/23	Seg 04/09/23
21	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	0,06%	0,05%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 15/08/23	Seg 04/09/23
22	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZI	0,07%	0,06%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 15/08/23	Seg 04/09/23
23	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	0,40%	0,36%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20 dias	Ter 15/08/23	Seg 11/09/23
24	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 15/08/23	Seg 04/09/23
25	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 15/08/23	Seg 04/09/23
1 / 38											

 PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO 											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Ago/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
26	CARGA E TRANSPORTE	0,46%	0,40%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	104 dias	Qua 16/08/23	Qua 03/01/24
27	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	0,11%	0,10%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	104 dias	Qua 16/08/23	Qua 03/01/24
28	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORES DE ENTULHO CAPA	0,35%	0,30%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	104 dias	Qua 16/08/23	Qua 03/01/24
29	PAREDES E VEDAÇÕES	2,40%	0,00%	0,95%	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%	40 dias	Ter 12/09/23	Sex 03/11/23
30	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEN	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3 dias	Seg 25/09/23	Qua 27/09/23
31	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (D	1,03%	0,00%	0,36%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	30 dias	Seg 25/09/23	Sex 03/11/23
32	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (D	0,11%	0,00%	0,04%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	30 dias	Seg 25/09/23	Sex 03/11/23
33	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (D	0,12%	0,00%	0,04%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	30 dias	Seg 25/09/23	Sex 03/11/23
34	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
35	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇ	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7 dias	Qua 27/09/23	Sex 06/10/23
36	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CH	0,94%	0,00%	0,33%	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	30 dias	Seg 25/09/23	Sex 03/11/23
37	COBERTURA	5,40%	0,00%	0,03%	3,47%	0,99%	0,91%	0,00%	66,5 dias	Sex 29/09/23	Qui 28/12/23
38	COBERTURA 01	3,55%	0,00%	0,03%	3,47%	0,05%	0,00%	0,00%	30,25 dias	Sex 29/09/23	Qui 09/11/23
39	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2 dias	Sex 27/10/23	Seg 30/10/23
40	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁ	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 03/11/23	Qui 09/11/23
41	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM P/	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3 dias	Ter 31/10/23	Qui 02/11/23
42	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E AC	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 03/11/23	Qui 09/11/23
43	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL -	0,09%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 20/10/23	Qui 26/10/23
44	VIGA H 10 A572 (W250X80,0)	0,19%	0,00%	0,02%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	8 dias	Sex 29/09/23	Ter 10/10/23
45	CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, COR CRIST.	1,50%	0,00%	0,00%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 13/10/23	Qui 19/10/23
46	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DI	0,19%	0,00%	0,02%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 29/09/23	Qui 12/10/23
47	CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, COR CRIST.	1,52%	0,00%	0,00%	1,52%	0,00%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 13/10/23	Qui 19/10/23
48	COBERTURA 02	1,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	0,91%	0,00%	35,75 dias	Sex 10/11/23	Qui 28/12/23
49	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E AC	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,05%	0,00%	5 dias	Qua 29/11/23	Ter 05/12/23
50	SOLDA (EMENDA) DE ESTACA METÁLICA TIPO PI	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 10/11/23	Sex 17/11/23
51	CONCRETO ARMADO FCK-21,0MPa, USINADO, B	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	8 dias	Sex 17/11/23	Ter 28/11/23
2 / 38											

 PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO 											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Ago/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
52	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR D	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,00%	10 dias	Sex 01/12/23	Qui 14/12/23
53	BRISSE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIV	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,00%	5 dias	Qui 21/12/23	Qui 28/12/23
54	VIGA H 10 A572 (W250X80,0)	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 24/11/23	Qui 30/11/23
55	PERFIL U ENRU LQ 4,75 X 100 X 50 X 17MM	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 24/11/23	Qui 30/11/23
56	PERFIL U ENRU LQ 4,75 X 200 X 50 X 17MM	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 24/11/23	Qui 30/11/23
57	PERFIL U ENRU LQ 3,00 X 75 X 40 X 15MM	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 24/11/23	Qui 30/11/23
58	CALHA EM FIBRA VIDRO, FORNECIMENTO E INS	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	4 dias	Sex 15/12/23	Qua 20/12/23
59	TUBO IND LQ QD 3,00X 100 X 100 NBR6591	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 24/11/23	Qui 30/11/23
60	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,15%	0,00%	0,00%	0,08%	0,07%	0,00%	0,00%	10 dias	Qua 25/10/23	Qua 08/11/23
61	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAM	0,15%	0,00%	0,00%	0,08%	0,07%	0,00%	0,00%	10 dias	Qua 25/10/23	Qua 08/11/23
62	ESQUADRIAS E VIDROS	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	1,25%	0,00%	15 dias	Seg 27/11/23	Qui 14/12/23
63	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	5 dias	Seg 27/11/23	Sex 01/12/23
64	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENK	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,01%	0,00%	5 dias	Seg 27/11/23	Sex 01/12/23
65	P03 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACAE	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,00%	15 dias	Seg 27/11/23	Qui 14/12/23
66	P01 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACAE	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,40%	0,00%	15 dias	Seg 27/11/23	Qui 14/12/23
67	P02 - KIT PORTA DE CORRER - 0,80X2,10M COM LAM	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,00%	15 dias	Seg 27/11/23	Qui 14/12/23
68	P10 - KIT PORTA DE ABRIR - BIPARTIDA - 0,80X2,10M	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	15 dias	Seg 27/11/23	Qui 14/12/23
69	P04 - KIT PORTA DE CORRER - 1,00X2,10M COM LAM	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,30%	0,00%	15 dias	Seg 27/11/23	Qui 14/12/23
70	P05 - KIT PORTA VAI E VEM - 1,20X2,10M COM VISOF	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,08%	0,00%	15 dias	Seg 27/11/23	Qui 14/12/23
71	P06 - KIT PORTA VAI E VEM - 1,20X2,10M COM LAMIN	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,23%	0,00%	15 dias	Seg 27/11/23	Qui 14/12/23
72	P08 - KIT PORTA VAI E VEM - 1,60X2,10M COM LAMIN	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,10%	0,00%	15 dias	Seg 27/11/23	Qui 14/12/23
73	P09 - KIT PORTA DE ABRIR - 1,60X2,10M AUTOMATIZ	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,00%	15 dias	Seg 27/11/23	Qui 14/12/23
74	REVESTIMENTO DE PAREDES	16,37%	0,00%	0,00%	0,02%	11,30%	5,05%	0,00%	32,75 dias	Ter 31/10/23	Qui 14/12/23
75	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	4 dias	Seg 13/11/23	Seg 20/11/23
76	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAI	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	0,00%	0,00%	5 dias	Seg 20/11/23	Sex 24/11/23
77	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACA	1,26%	0,00%	0,00%	0,02%	1,24%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 31/10/23	Qua 22/11/23
3 / 38											



PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO



Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Ago/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
78	REVESTIMENTO COM CHAPA EM FÓRMICA PADRÃO	13,77%	0,00%	0,00%	0,00%	8,72%	5,05%	0,00%	15 dias	Seg 27/11/23	Qui 14/12/23
79	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 17/11/23	Sex 24/11/23
80	PAVIMENTACOES E ARREMATAS	5,08%	0,00%	0,03%	2,99%	2,06%	0,00%	0,00%	45 dias	Sex 06/10/23	Qui 07/12/23
81	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACA	0,40%	0,00%	0,00%	0,01%	0,39%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 31/10/23	Qua 22/11/23
82	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENT	0,84%	0,00%	0,03%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
83	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	1,02%	0,00%	0,00%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 27/10/23	Seg 06/11/23
84	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSUR	0,05%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 27/10/23	Seg 06/11/23
85	REGULARIZAÇÃO C/ ARGAMASSA C/ ADESIVO RESI	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	2 dias	Qua 22/11/23	Qui 23/11/23
86	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM J	1,08%	0,00%	0,00%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 13/10/23	Sex 03/11/23
87	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	4 dias	Sex 03/11/23	Qua 08/11/23
88	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 17/11/23	Sex 24/11/23
89	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%	1,39%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 24/11/23	Qui 07/12/23
90	FORROS E PINTURA EM TETO	3,35%	0,00%	0,00%	1,51%	1,85%	0,00%	0,00%	23 dias	Sex 20/10/23	Qua 22/11/23
91	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TET	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	4 dias	Seg 13/11/23	Seg 20/11/23
92	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATE	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	4 dias	Qui 16/11/23	Qua 22/11/23
93	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TE	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,00%	0,00%	8 dias	Qui 09/11/23	Ter 21/11/23
94	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PI	1,91%	0,00%	0,00%	1,29%	0,62%	0,00%	0,00%	20 dias	Sex 20/10/23	Sex 17/11/23
95	ASSENTAMENTO DE FORRO DE GESSO ACARTONA	0,38%	0,00%	0,00%	0,22%	0,17%	0,00%	0,00%	15 dias	Qui 26/10/23	Sex 17/11/23
96	BANCADAS, TESTEIRA, RODOPIA, BALCÕES E DIVISÓ	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	1,34%	0,00%	0,00%	5 dias	Seg 20/11/23	Sex 24/11/23
97	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	5 dias	Seg 20/11/23	Sex 24/11/23
98	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINH	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	5 dias	Seg 20/11/23	Sex 24/11/23
99	FILETE EM GRANITO BRANCO DALLAS, 10CM, PARA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5 dias	Seg 20/11/23	Sex 24/11/23
100	BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBA	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	5 dias	Seg 20/11/23	Sex 24/11/23
101	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 7 CA	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	5 dias	Seg 20/11/23	Sex 24/11/23
102	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	5 dias	Seg 20/11/23	Sex 24/11/23
103	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	5 dias	Seg 20/11/23	Sex 24/11/23

4 / 38



PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO



Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Ago/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
104	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	5 dias	Seg 20/11/23	Sex 24/11/23
105	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 35 X 40CM, PAVIMENTO	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	5 dias	Seg 20/11/23	Sex 24/11/23
106	LOUCAS E METAIS	3,62%	0,00%	0,00%	0,18%	2,36%	1,07%	0,00%	39 dias	Qua 18/10/23	Seg 11/12/23
107	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL	0,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	5 dias	Qua 18/10/23	Qua 25/10/23
108	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL	0,13%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	5 dias	Qua 18/10/23	Qua 25/10/23
109	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	5 dias	Qua 18/10/23	Qua 25/10/23
110	ESPELHO PLANO 4MM	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	5 dias	Seg 04/12/23	Seg 11/12/23
111	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	5 dias	Qua 22/11/23	Ter 28/11/23
112	TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	5 dias	Ter 21/11/23	Ter 28/11/23
113	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	5 dias	Ter 21/11/23	Ter 28/11/23
114	DUCHA CROMADA, DECA, LINHA DUNA 1984 C 61 OI	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,06%	0,00%	5 dias	Ter 28/11/23	Seg 04/12/23
115	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10)	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 24/11/23	Qui 30/11/23
116	ASSENTO PARA BANHO ARTICULÁVEL, REF. 2355 E	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,19%	0,00%	5 dias	Ter 28/11/23	Seg 04/12/23
117	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	5 dias	Seg 04/12/23	Seg 11/12/23
118	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS COM	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 24/11/23	Qui 30/11/23
119	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", F	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5 dias	Ter 28/11/23	Seg 04/12/23
120	CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECI	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,04%	0,00%	5 dias	Ter 28/11/23	Seg 04/12/23
121	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPI	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 24/11/23	Qui 30/11/23
122	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	5 dias	Seg 04/12/23	Seg 11/12/23
123	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	5 dias	Seg 04/12/23	Seg 11/12/23
124	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40C	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	5 dias	Seg 04/12/23	Seg 11/12/23
125	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80C	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	5 dias	Seg 04/12/23	Seg 11/12/23
126	LAVATÓRIO CELITE LINHA NET SUSPENSO COD. 19	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 24/11/23	Qui 30/11/23
127	TORNEIRA LAVATÓRIO BALCÃO 1193 C 58 MEBER L	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,02%	0,00%	5 dias	Ter 28/11/23	Seg 04/12/23
128	TORNEIRA LAVATÓRIO BALCÃO MEBERMATIC 1007	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,13%	0,00%	5 dias	Ter 28/11/23	Seg 04/12/23
129	TORNEIRA MEBER LAVATÓRIO COM ALAVANCA CO	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	5 dias	Ter 28/11/23	Seg 04/12/23

5 / 38

PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO											
											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Ago/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
130	BARRA DE SEGURANÇA 80CM COD. 14566 MARCA: S	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,08%	0,00%	5 dias	Ter 28/11/23	Seg 04/12/23
131	BARRA REBATIVEL ANODIZADO COD. 23757 MARCA:	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,06%	0,00%	5 dias	Ter 28/11/23	Seg 04/12/23
132	DIVERSOS	1,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	1,46%	0,00%	28 dias	Sex 17/11/23	Sex 22/12/23
133	CORTINA DIVISORIA DE LEITO EM PVC (VINIL), LARG	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,94%	0,00%	8 dias	Qui 07/12/23	Seg 18/12/23
134	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", E	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	5 dias	Sex 17/11/23	Qui 23/11/23
135	PROTECTOR DE PAREDE E CORRIMÃO/BATE MACAS	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,53%	0,00%	13 dias	Qui 07/12/23	Sex 22/12/23
136	LIMPEZA FINAL	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	9 dias	Ter 26/12/23	Seg 08/01/24
137	LIMPEZA GERAL	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	9 dias	Ter 26/12/23	Seg 08/01/24
138	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA	1,42%	0,12%	0,14%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	32 dias	Seg 18/09/23	Seg 30/10/23
139	INSTALACAO DE AGUA FRIA	0,37%	0,00%	0,01%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 06/10/23	Qui 26/10/23
140	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM P	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 06/10/23	Qui 26/10/23
141	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SU	0,32%	0,00%	0,01%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 06/10/23	Qui 26/10/23
142	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 06/10/23	Qui 26/10/23
143	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 06/10/23	Qui 26/10/23
144	INSTALACAO DE AGUA QUENTE	0,58%	0,00%	0,00%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 10/10/23	Seg 30/10/23
145	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE	0,05%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 10/10/23	Seg 30/10/23
146	RESERVATORIO TERMICO/BOILER SOLAR EM AÇO I	0,38%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 10/10/23	Seg 30/10/23
147	TUBO CPVC RÍGIDO SOLDÁVEL AQUATHERM PARA	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 10/10/23	Seg 30/10/23
148	TUBO CPVC RÍGIDO SOLDÁVEL AQUATHERM PARA	0,05%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 10/10/23	Seg 30/10/23
149	TUBO CPVC RÍGIDO SOLDÁVEL AQUATHERM PARA	0,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 10/10/23	Seg 30/10/23
150	TUBO CPVC RÍGIDO SOLDÁVEL AQUATHERM PARA	0,05%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 10/10/23	Seg 30/10/23
151	INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO	0,47%	0,12%	0,13%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	32 dias	Seg 18/09/23	Seg 30/10/23
152	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 18/09/23	Sex 06/10/23
153	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 18/09/23	Sex 06/10/23
154	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 18/09/23	Sex 06/10/23
155	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 18/09/23	Sex 06/10/23
6 /38											

PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO											
											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Ago/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
156	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE	0,09%	0,07%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 18/09/23	Sex 06/10/23
157	REATERRO MANUAI APOILOADO COM SOQUETE AF	0,05%	0,04%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 18/09/23	Sex 06/10/23
158	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM A	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
159	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOI	0,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 10/10/23	Seg 30/10/23
160	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOI	0,13%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 10/10/23	Seg 30/10/23
161	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOI	0,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Ter 10/10/23	Seg 30/10/23
162	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27,10%	0,00%	7,54%	13,55%	3,15%	2,87%	0,00%	81 dias	Ter 12/09/23	Qui 28/12/23
163	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,13%	0,00%	6,18%	7,19%	2,75%	0,00%	0,00%	63 dias	Ter 12/09/23	Ter 05/12/23
164	INFRAESTRUTURA ELETROCALHA - QDE 1 EM	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
165	SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 20	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
166	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200X50 C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
167	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
168	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
169	GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOP	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
170	PERFILADO, PRE-ZINCADO A FOGO, PERFURAD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
171	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
172	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIME	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
173	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
174	JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO, (R	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
175	JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO, (F	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
176	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE E	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
177	SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
178	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
179	FORNECIMENTO DE CHUMBADOR "CB" COM PAF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
180	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCAL	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
181	TALA PARA EMENDA, 50MM, ZINCADA, PARA ELE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
7 /38											

PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO											
JD CONSTRUTORA Hospital do Subúrbio											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Ago/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
182	INFRAESTRUTURA ELETROCALHA - QDE 2 EM	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
183	SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 20	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
184	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200X50 CM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
185	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
186	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO 1	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
187	GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOP	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
188	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
189	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
190	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIME	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
191	JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO, (R	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
192	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE E	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
193	SAIDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
194	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
195	FORNECIMENTO DE CHUMBADOR "CB" COM PAF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
196	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCAL	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
197	TALA PARA EMENDA, 50MM, ZINCADA, PARA ELE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
198	INFRAESTRUTURA ELETROCALHA - QDE 3 EM	0,22%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
199	SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 20	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
200	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200X50 CM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
201	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
202	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO 1	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
203	GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOP	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
204	EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "X", (	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
205	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
206	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
207	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIME	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
8 /38											

PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO											
JD CONSTRUTORA Hospital do Subúrbio											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Ago/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
208	JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO, (R	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
209	JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO, (F	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
210	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE E	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
211	SAIDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
212	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
213	FORNECIMENTO DE CHUMBADOR "CB" COM PAF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
214	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCAL	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
215	TALA PARA EMENDA, 50MM, ZINCADA, PARA ELE	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
216	INFRAESTRUTURA ELETROCALHA - QDNB 5 UTI	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
217	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
218	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
219	GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOP	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
220	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
221	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
222	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIME	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
223	JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO, (R	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
224	JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO, (F	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
225	FORNECIMENTO DE CHUMBADOR "CB" COM PAF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Ter 12/09/23	Seg 25/09/23
226	PONTOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,36%	0,00%	4,40%	1,96%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
227	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPV	0,23%	0,00%	0,16%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
228	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², AI	0,93%	0,00%	0,65%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
229	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², AN	0,39%	0,00%	0,27%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
230	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETR	0,21%	0,00%	0,14%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
231	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETR	0,04%	0,00%	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
232	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELE	0,44%	0,00%	0,31%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
233	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORI	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
9 /38											

 PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO 											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Ago/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
234	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA	0,13%	0,00%	0,09%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
235	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA	0,03%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
236	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBU	0,29%	0,00%	0,20%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
237	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBU	0,21%	0,00%	0,15%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
238	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA	0,11%	0,00%	0,08%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
239	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 1	0,63%	0,00%	0,44%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
240	PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTR	0,06%	0,00%	0,04%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
241	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO C	0,13%	0,00%	0,09%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
242	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GA	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
243	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELE	1,98%	0,00%	1,37%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
244	PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T, ABNT, DE EME	0,24%	0,00%	0,17%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
245	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO SEM CX	0,27%	0,00%	0,19%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Seg 25/09/23	Sex 13/10/23
246	LUMINÁRIAS	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	2,40%	0,00%	0,00%	10 dias	Qua 22/11/23	Ter 05/12/23
247	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	10 dias	Qua 22/11/23	Ter 05/12/23
248	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA LED 40W*, E	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Qua 22/11/23	Ter 05/12/23
249	INFRAESTRUTURA ELETROCALHA - Q1T1 E Q1T2	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
250	SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 10	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
251	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETR	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
252	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
253	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
254	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
255	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETRC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
256	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
257	CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
258	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
259	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIME	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
10 / 38											

 PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO 											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Ago/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
260	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
261	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCAL	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
262	FORNECIMENTO DE CHUMBADOR "CB" COM PAF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
263	TALA PARA EMENDA, 50MM, ZINCADA, PARA ELE	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
264	INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS - SISTEMA IT	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
265	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GA	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
266	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO SEM CX	0,15%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
267	TOMADAS - SISTEMA IT	0,19%	0,00%	0,01%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
268	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 1	0,19%	0,00%	0,01%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
269	QUADROS ELÉTRICOS COMPLETOS E ALIMENTAD	5,40%	0,00%	0,00%	5,04%	0,35%	0,00%	0,00%	20 dias	Sex 20/10/23	Sex 17/11/23
270	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², AN	0,14%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 20/10/23	Sex 03/11/23
271	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², AN	0,09%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 20/10/23	Sex 03/11/23
272	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², AN	0,68%	0,00%	0,00%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 20/10/23	Sex 03/11/23
273	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6	0,85%	0,00%	0,00%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 20/10/23	Sex 03/11/23
274	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA	0,06%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 20/10/23	Sex 03/11/23
275	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA	0,06%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 20/10/23	Sex 03/11/23
276	FORNECIMENTO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO TII	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 20/10/23	Sex 03/11/23
277	FORNECIMENTO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO TII	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 20/10/23	Sex 03/11/23
278	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
279	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 20/10/23	Sex 03/11/23
280	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 20/10/23	Qui 09/11/23
281	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 20/10/23	Qui 09/11/23
282	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 20/10/23	Qui 09/11/23
283	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 20/10/23	Qui 09/11/23
284	QUADRO QDE 1 EM - COMPLETO	0,07%	0,00%	0,00%	0,06%	0,01%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 20/10/23	Qui 09/11/23
285	QUADRO QDE 2 EM - COMPLETO	0,09%	0,00%	0,00%	0,08%	0,01%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 20/10/23	Qui 09/11/23
11 / 38											

PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO											
JD CONSTRUTORA Hospital do Subúrbio											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Ago/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
286	QUADRO QDE 3 EM - COMPLETO	0,09%	0,00%	0,00%	0,09%	0,01%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 20/10/23	Qui 09/11/23
287	QUADRO QDNB 5 UTI - COMPLETO	0,08%	0,00%	0,00%	0,07%	0,01%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 20/10/23	Qui 09/11/23
288	QUADRO QDNB EM - COMPLETO	0,04%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 20/10/23	Qui 09/11/23
289	QUADRO QDFAC - COMPLETO	0,19%	0,00%	0,00%	0,17%	0,02%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 20/10/23	Qui 09/11/23
290	QUADRO Q1T1-SUTI - COMPLETO COM TRAFQ IT	0,53%	0,00%	0,00%	0,48%	0,05%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 20/10/23	Qui 09/11/23
291	QUADRO Q1T2-SUTI - COMPLETO COM TRAFQ IT	0,53%	0,00%	0,00%	0,48%	0,05%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 20/10/23	Qui 09/11/23
292	QUADRO Q1T101 - COMPLETO COM TRAFQ IT MI	0,47%	0,00%	0,00%	0,42%	0,05%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 20/10/23	Qui 09/11/23
293	QUADRO Q1T102 - COMPLETO COM TRAFQ IT MI	0,47%	0,00%	0,00%	0,42%	0,05%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 20/10/23	Qui 09/11/23
294	QUADRO Q1T103 - COMPLETO COM TRAFQ IT MI	0,48%	0,00%	0,00%	0,43%	0,05%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 20/10/23	Qui 09/11/23
295	QUADRO Q1T4 - COMPLETO COM TRAFQ IT MED	0,47%	0,00%	0,00%	0,42%	0,05%	0,00%	0,00%	15 dias	Sex 20/10/23	Qui 09/11/23
296	INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO E ALIMENTA	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
297	SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 20	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
298	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200X50 CI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
299	CAIXA DE ALUMÍNIO 40 X 40 X 12 CM, FORNECIMI	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
300	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO SEM CX	0,67%	0,00%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
301	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
302	CHUMBADOR WALSYMA CB 314200 D=1/4"X2"	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
303	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 4"	0,01%		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
304	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESAD	0,05%		0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
305	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
306	CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂ	0,01%		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
307	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂ	0,02%		0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
308	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE E	0,02%		0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
309	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 2	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
310	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GA	0,01%		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
311	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCAL	0,11%		0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
12 /38											

PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO											
JD CONSTRUTORA Hospital do Subúrbio											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Ago/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
312	CABEAMENTO ESTRUTURADO	3,02%		0,04%	2,61%	0,38%	0,00%	0,00%	30 dias	Sex 06/10/23	Sex 17/11/23
313	INFRAESTRUTURA ELETROCALHA - LÓGICA/CABE	0,28%		0,01%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
314	SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 30	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
315	SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 10	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
316	SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 20	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
317	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300X50 CI	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
318	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORI	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
319	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCAL	0,03%		0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
320	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO	0,02%		0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
321	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO	0,05%		0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
322	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 300 X 100 X 100MM PA	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
323	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
324	CHUMBADOR WALSYMA CB 314200 D=1/4"X2"	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
325	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIME	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
326	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMA	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
327	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VER	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
328	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE HORIZO	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
329	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCAL	0,02%		0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
330	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 2	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
331	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCAL	0,06%		0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
332	TALA PARA EMENDA, 50MM, ZINCADA, PARA ELE	0,02%		0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
333	INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS - LÓGICA/CABE	0,67%		0,03%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
334	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPV	0,07%		0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
335	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN	0,06%		0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
336	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETR	0,03%		0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
337	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETR	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
13 /38											

PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO											
											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Aço/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
338	CAIXA DE DERIVAÇÃO EM PVC 4" X 2" S/TAMPA,	0,02%		0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
339	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR,	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
340	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA :	0,09%		0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
341	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA :	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
342	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GA	0,04%		0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
343	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GA	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
344	CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM EM CHAPA DE AI	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
345	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AI	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
346	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO SEM CX	0,32%		0,01%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
347	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO SEM CX	0,02%		0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
348	CABOS	1,49%		0,00%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 20/10/23	Sex 03/11/23
349	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP	1,44%		0,00%	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 20/10/23	Sex 03/11/23
350	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS	0,05%		0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 20/10/23	Sex 03/11/23
351	ACESSÓRIOS	0,58%		0,00%	0,20%	0,38%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
352	CERTIFICAÇÃO DE CABO UTP CAT6	0,05%		0,00%	0,02%	0,03%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
353	FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA 50/125 MICRONS ATÉ 2	0,02%		0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
354	CERTIFICAÇÃO DE CABO ÓTICO	0,01%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
355	KIT PARA FUSÃO DE FIBRA ÓTICA 50/125MI COM	0,01%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
356	RÉGUA ELÉTRICA PARA RACKS PADRÃO NOVO	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
357	GUIA FRONTAL PARA CABOS	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
358	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR	0,07%		0,00%	0,03%	0,05%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
359	KIT DE PARAFUSO COM PORCA GAIOLA	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
360	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH COR	0,09%		0,00%	0,03%	0,06%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
361	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 P	0,07%		0,00%	0,02%	0,04%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
362	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANE	0,01%		0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
363	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHA	0,04%		0,00%	0,01%	0,03%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
14 / 38											



PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO											
											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Aço/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
364	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANI	0,08%		0,00%	0,03%	0,05%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
365	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH COR	0,07%		0,00%	0,02%	0,05%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
366	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O	0,03%		0,00%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
367	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFUR	0,01%		0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
368	KIT DE VENTILAÇÃO PADRÃO 19 400MM 4 VENTIL	0,01%		0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
369	INSTALACAO DE ALARME - DETECÇÃO	1,27%		0,05%	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
370	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC O	0,02%		0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
371	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETROD	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
372	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETROD	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
373	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETROI	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
374	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODI	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
375	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODI	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
376	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO S	0,04%		0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
377	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO S	0,20%		0,01%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
378	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO S	0,05%		0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
379	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO	0,10%		0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
380	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, 120DB, PAR	0,03%		0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
381	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - MODELO AM	0,03%		0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
382	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, M	0,24%		0,01%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
383	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE IN	0,51%		0,02%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
384	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
385	DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ENDEREÇÁVEL	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
386	INSTALAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM	0,80%		0,03%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
387	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC O	0,05%		0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
388	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
389	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 I	0,04%		0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
15 / 38											



PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO											
JD CONSTRUTORA Hospital do Subúrbio											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Aço/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
390	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETROD	0,03%		0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
391	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETROD	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
392	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM	0,08%		0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
393	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
394	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 C	0,03%		0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
395	CENTRAL POSTO DE ENFERMAGEM CONVENCIONA	0,11%		0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
396	MÓDULO DE CENTRAL DO POSTO DE ENFERMAGE	0,16%		0,01%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
397	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVA	0,02%		0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
398	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVA	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
399	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO SEM COST	0,14%		0,01%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
400	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO SEM COST	0,12%		0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
401	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	4,57%		1,14%	1,60%	0,00%	1,83%	0,00%	71 dias	Seg 25/09/23	Qui 28/12/23
402	INFRAESTRUTURA TUBULAÇÕES EM COBRE	2,74%		1,14%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
403	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPV	0,06%		0,02%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
404	COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SE	0,01%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
405	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A,	0,81%		0,34%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
406	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A,	0,21%		0,09%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
407	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A,	0,05%		0,02%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
408	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A,	0,35%		0,14%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
409	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BROI	0,10%		0,04%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
410	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SE	0,04%		0,02%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
411	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SE	0,01%		0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
412	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A,	0,55%		0,23%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
413	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SE	0,03%		0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
414	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA,	0,03%		0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
415	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA,	0,05%		0,02%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
16 /38											



PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO											
JD CONSTRUTORA Hospital do Subúrbio											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Aço/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
416	TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA,	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
417	TESTES DE ESTANQUIDADE DAS RESPECTIVAS	0,03%		0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
418	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SEÇÃO COM VALVUL	0,41%		0,17%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	25 dias	Seg 25/09/23	Qui 26/10/23
419	RÉGUAS PARA LEITOS	1,83%		0,00%	0,00%	0,00%	1,83%	0,00%	10 dias	Qui 14/12/23	Qui 28/12/23
420	RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, DIMENS	0,35%		0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,00%	10 dias	Qui 14/12/23	Qui 28/12/23
421	RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, DIMENS	0,35%		0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,00%	10 dias	Qui 14/12/23	Qui 28/12/23
422	RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, DIMENS	1,04%		0,00%	0,00%	0,00%	1,04%	0,00%	10 dias	Qui 14/12/23	Qui 28/12/23
423	RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, DIMENS	0,09%		0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	10 dias	Qui 14/12/23	Qui 28/12/23
424	INSTALAÇÕES DE SPRINKLERS	0,10%		0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
425	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMET	0,01%		0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
426	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SC	0,03%		0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
427	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQ	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
428	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQL	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
429	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CON	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
430	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEA	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
431	SPRINKLER TIPO QUARTZOID PARA TEMPERATURA	0,06%		0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
432	EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE ROTAS DE FUGA	0,18%		0,00%	0,15%	0,01%	0,01%	0,00%	52 dias	Sex 06/10/23	Sex 15/12/23
433	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLAS	0,01%		0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
434	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 6	0,02%		0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
435	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE	0,02%		0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
436	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE	0,02%		0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	1 dia	Sex 03/11/23	Seg 06/11/23
437	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGIS	0,08%		0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	1 dia	Sex 03/11/23	Seg 06/11/23
438	PORTA CORTA-FOGO 240X210X4CM - FORNECIME	0,02%		0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	1 dia	Sex 03/11/23	Seg 06/11/23
439	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 30X	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1 dia	Qui 14/12/23	Sex 15/12/23
440	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1 dia	Qui 14/12/23	Sex 15/12/23
441	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM	0,01%		0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	1 dia	Qui 14/12/23	Sex 15/12/23
17 /38											



 PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO 											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Aço/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
442	EQUIPAMENTOS - NO BREAKS E ITS MÉDICOS	1,02%		0,00%	0,00%	0,00%	1,02%	0,00%	5 dias	Qui 14/12/23	Qui 21/12/23
443	NOBREAK ENGETRON SAFESERVER POWER 6KVA	0,35%		0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,00%	5 dias	Qui 14/12/23	Qui 21/12/23
444	NOBREAK ENGETRON DOUBLE WAY MONOFASICO	0,53%		0,00%	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	5 dias	Qui 14/12/23	Qui 21/12/23
445	NOBREAK ENGETRON SAFESERVER POWER 3,2KV	0,15%		0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	5 dias	Qui 14/12/23	Qui 21/12/23
446	AR CONDICIONADO	23,69%		2,91%	9,20%	8,40%	3,00%	0,00%	65 dias	Seg 25/09/23	Qua 20/12/23
447	EQUIPAMENTOS	11,75%		0,00%	3,53%	5,75%	2,48%	0,00%	45 dias	Sex 20/10/23	Qua 20/12/23
448	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CI	0,13%		0,00%	0,04%	0,07%	0,03%	0,00%	45 dias	Sex 20/10/23	Qua 20/12/23
449	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CI	0,13%		0,00%	0,04%	0,06%	0,03%	0,00%	45 dias	Sex 20/10/23	Qua 20/12/23
450	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CI	0,38%		0,00%	0,11%	0,19%	0,08%	0,00%	45 dias	Sex 20/10/23	Qua 20/12/23
451	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO ANTIMIK	1,49%		0,00%	0,45%	0,73%	0,31%	0,00%	45 dias	Sex 20/10/23	Qua 20/12/23
452	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS ABSOL	0,75%		0,00%	0,22%	0,37%	0,16%	0,00%	45 dias	Sex 20/10/23	Qua 20/12/23
453	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONAD	2,03%		0,00%	0,61%	0,99%	0,43%	0,00%	45 dias	Sex 20/10/23	Qua 20/12/23
454	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONAD	2,00%		0,00%	0,60%	0,98%	0,42%	0,00%	45 dias	Sex 20/10/23	Qua 20/12/23
455	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONAD	1,40%		0,00%	0,42%	0,69%	0,30%	0,00%	45 dias	Sex 20/10/23	Qua 20/12/23
456	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONAD	2,21%		0,00%	0,66%	1,08%	0,47%	0,00%	45 dias	Sex 20/10/23	Qua 20/12/23
457	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONAD	1,23%		0,00%	0,37%	0,60%	0,26%	0,00%	45 dias	Sex 20/10/23	Qua 20/12/23
458	DUTOS	8,16%		2,82%	5,34%	0,00%	0,00%	0,00%	30 dias	Seg 25/09/23	Sex 03/11/23
459	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN	0,07%		0,02%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	30 dias	Seg 25/09/23	Sex 03/11/23
460	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN	0,05%		0,02%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	30 dias	Seg 25/09/23	Sex 03/11/23
461	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COI	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30 dias	Seg 25/09/23	Sex 03/11/23
462	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COI	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30 dias	Seg 25/09/23	Sex 03/11/23
463	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COI	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30 dias	Seg 25/09/23	Sex 03/11/23
464	DUTO FLEXIVEL ISODEC 60, COM KVR (REGISTRO D	1,36%		0,47%	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	30 dias	Seg 25/09/23	Sex 03/11/23
465	DUTO EM CHAPA GALVANIZADA PARA SISTEMA DE	0,95%		0,33%	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	30 dias	Seg 25/09/23	Sex 03/11/23
466	DUTOS DE CLIMATIZAÇÃO EM MPU ESPESSURA 20	2,95%		1,02%	1,93%	0,00%	0,00%	0,00%	30 dias	Seg 25/09/23	Sex 03/11/23
467	DUTOS DE CLIMATIZAÇÃO EM MPU ESPESSURA 20	2,77%		0,96%	1,81%	0,00%	0,00%	0,00%	30 dias	Seg 25/09/23	Sex 03/11/23
18 / 38											



 PLANEJAMENTO OBRA REFORMA HOSPITAL DO SUBURBIO 											
Id	Nome da tarefa	% de Obra	% - Aço/23	% - Set/23	% - Out/23	% - Nov/23	% - Dez/23	% - Jan/24	Duração	Início	Término
468	GRELHAS	3,13%		0,00%	0,00%	2,60%	0,52%	0,00%	15 dias	Qua 22/11/23	Seg 11/12/23
469	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE EX	0,08%		0,00%	0,00%	0,07%	0,01%	0,00%	15 dias	Qua 22/11/23	Seg 11/12/23
470	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE EX	0,10%		0,00%	0,00%	0,09%	0,02%	0,00%	15 dias	Qua 22/11/23	Seg 11/12/23
471	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE EX	0,05%		0,00%	0,00%	0,04%	0,01%	0,00%	15 dias	Qua 22/11/23	Seg 11/12/23
472	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE IN	0,02%		0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	15 dias	Qua 22/11/23	Seg 11/12/23
473	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE IN	1,61%		0,00%	0,00%	1,34%	0,27%	0,00%	15 dias	Qua 22/11/23	Seg 11/12/23
474	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE IN	1,20%		0,00%	0,00%	1,00%	0,20%	0,00%	15 dias	Qua 22/11/23	Seg 11/12/23
475	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE IN	0,04%		0,00%	0,00%	0,03%	0,01%	0,00%	15 dias	Qua 22/11/23	Seg 11/12/23
476	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR DE IN	0,03%		0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	15 dias	Qua 22/11/23	Seg 11/12/23
477	DIVERSOS	0,65%		0,08%	0,33%	0,05%	0,00%	0,00%	40 dias	Seg 25/09/23	Sex 17/11/23
478	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTIGOS (COND	0,13%		0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 06/10/23	Sex 20/10/23
479	REMOÇÃO DE DUTOS DE CLIMATIZAÇÃO	0,14%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23
480	POSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS (C	0,18%		0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	5 dias	Qui 26/10/23	Sex 03/11/23
481	FUO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS DE 40 MM	0,08%		0,00%	0,03%	0,05%	0,00%	0,00%	10 dias	Sex 03/11/23	Sex 17/11/23
482	ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO ATÉ 2 T	0,13%		0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	5 dias	Qui 26/10/23	Sex 03/11/23
19 / 38											

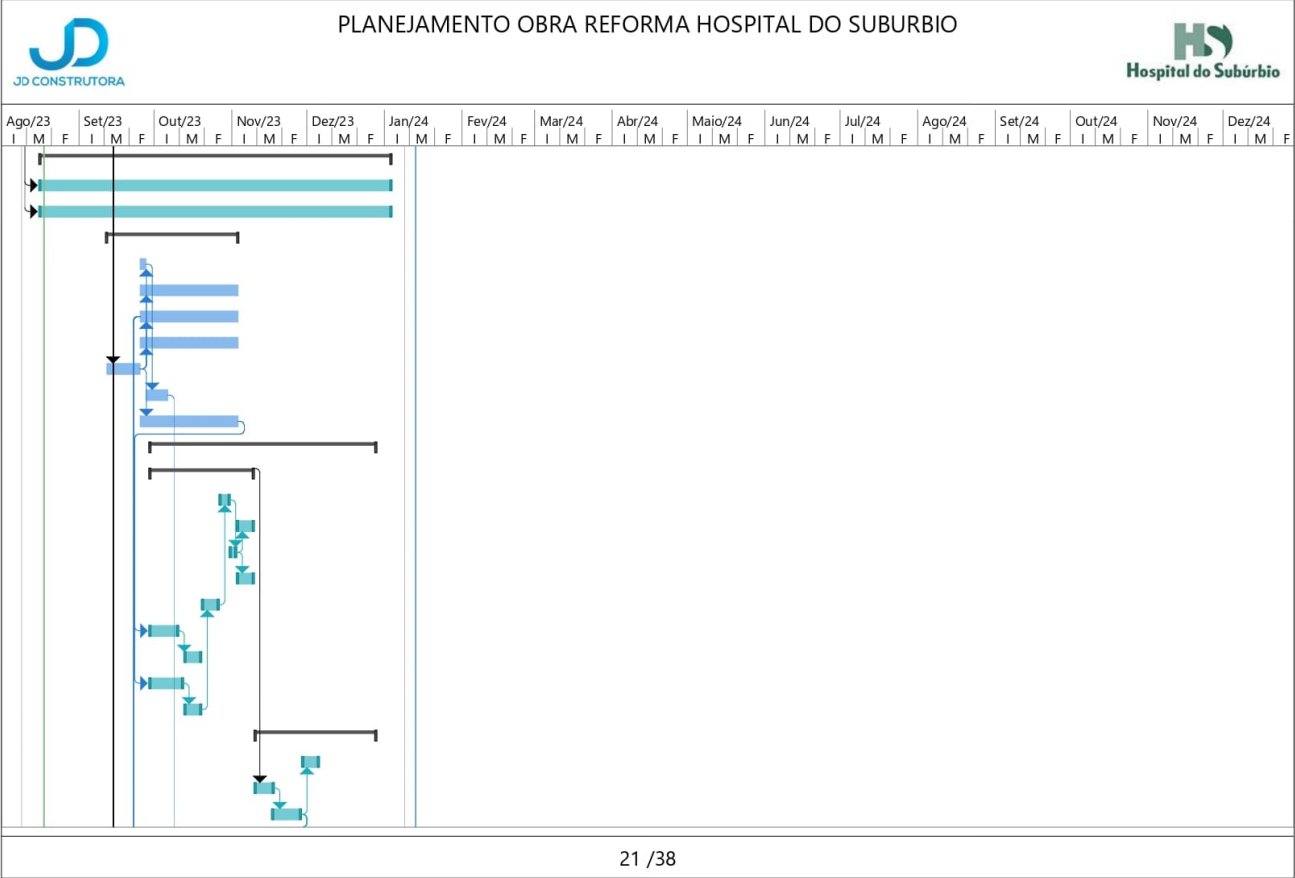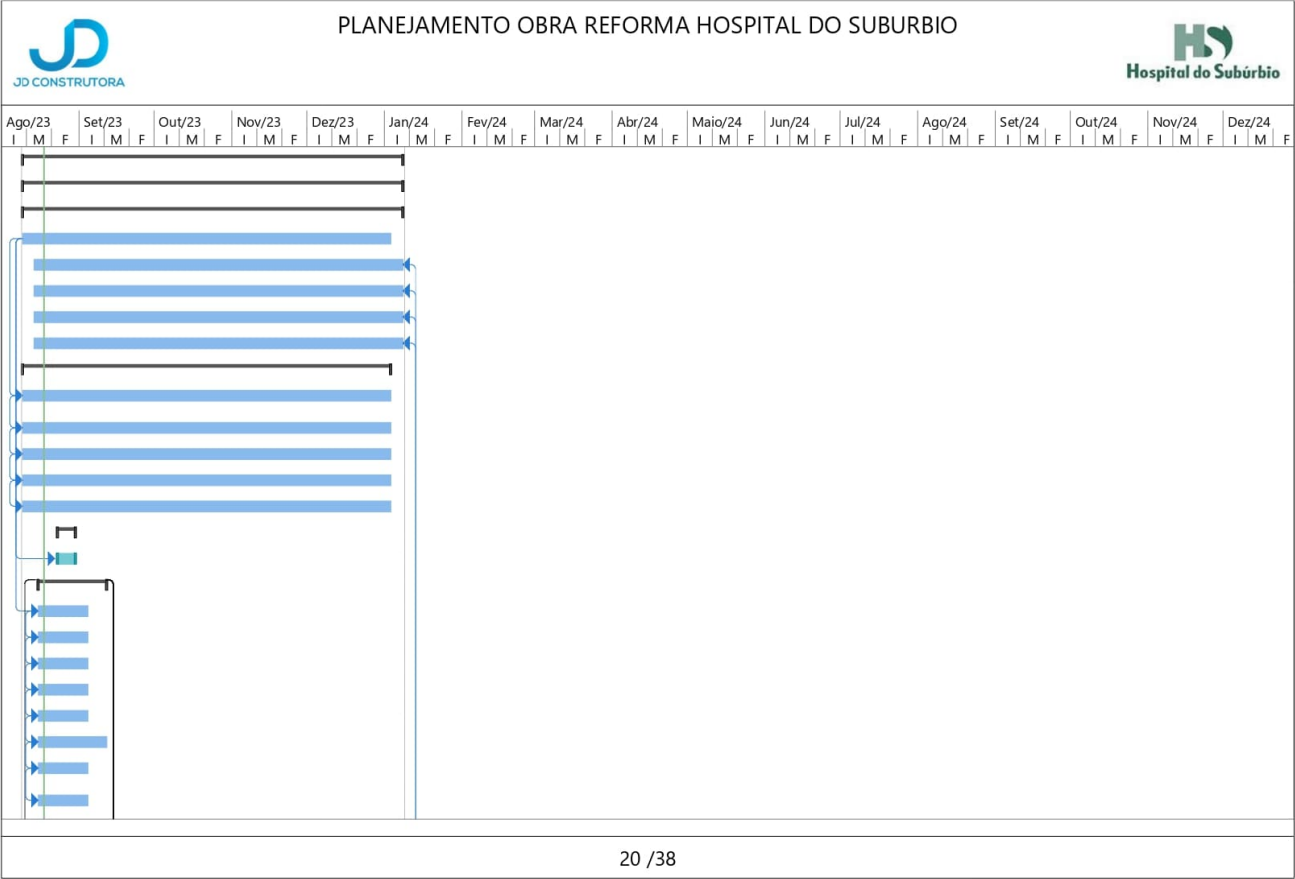


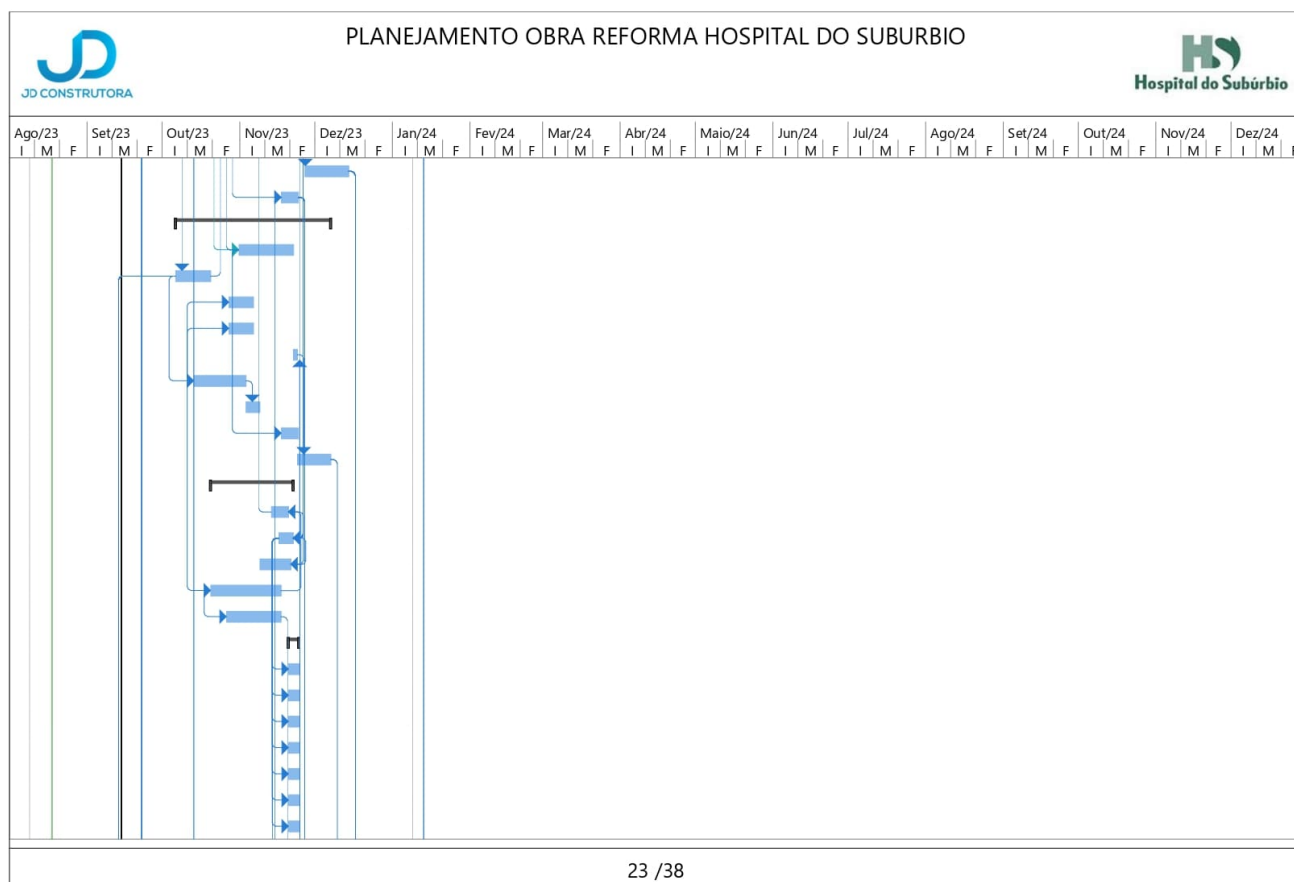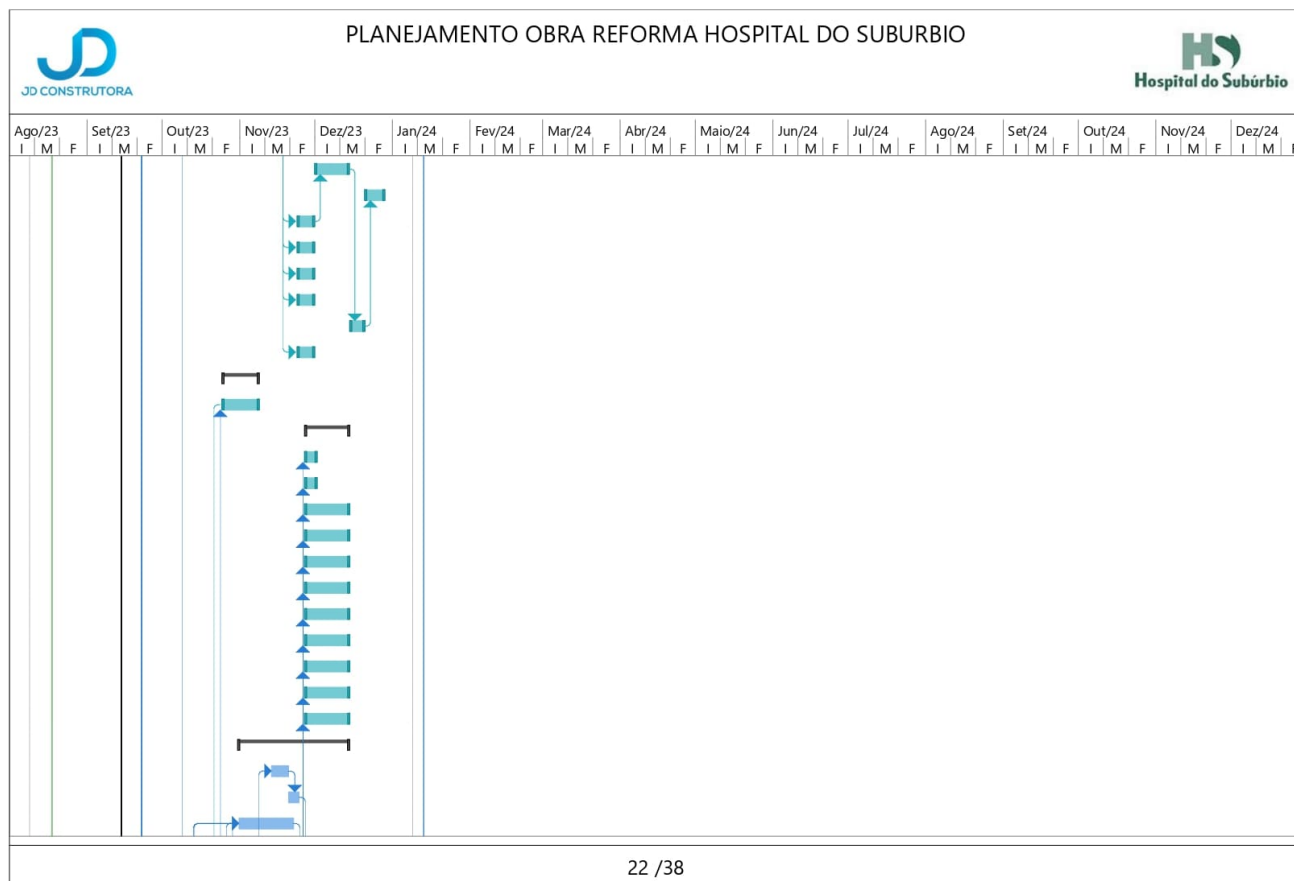

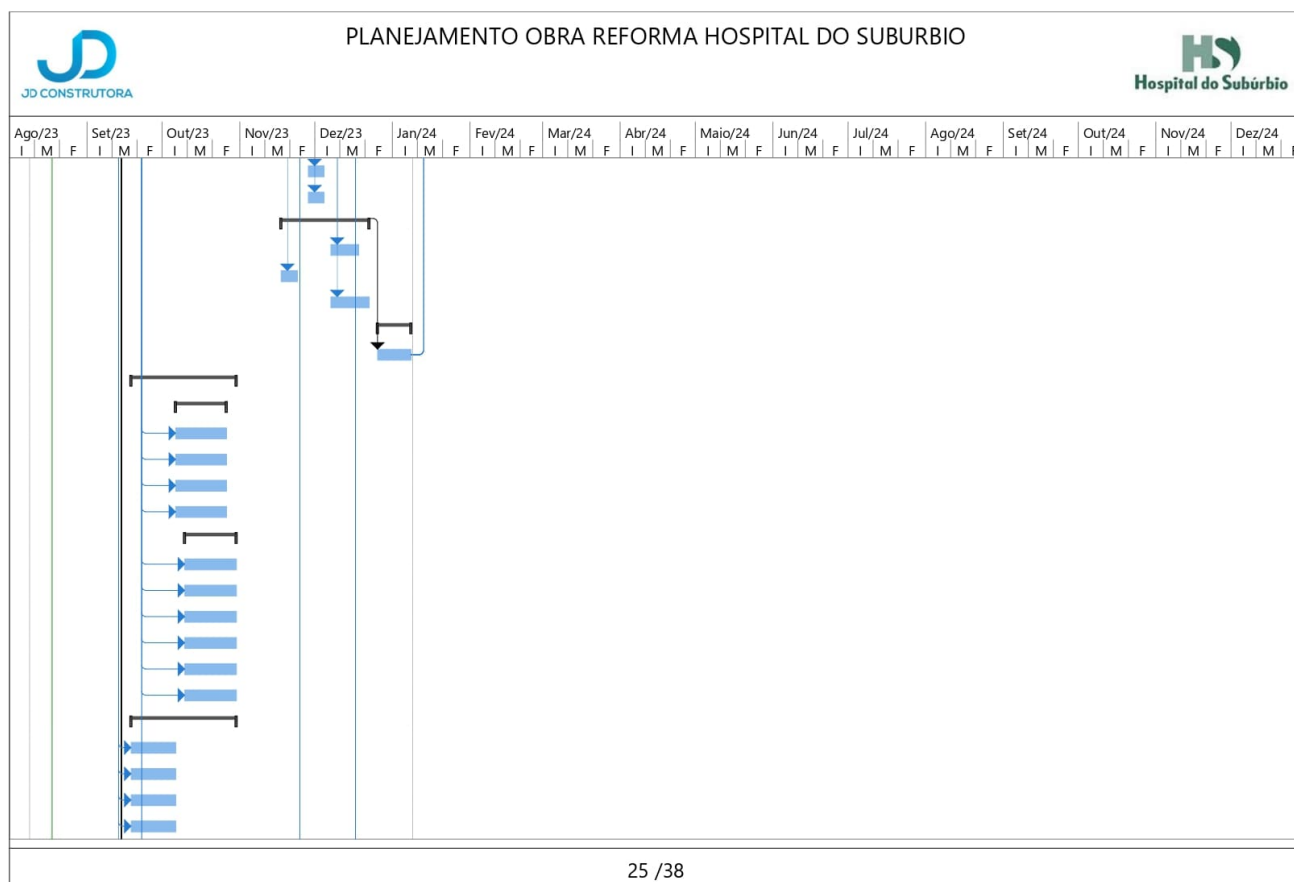
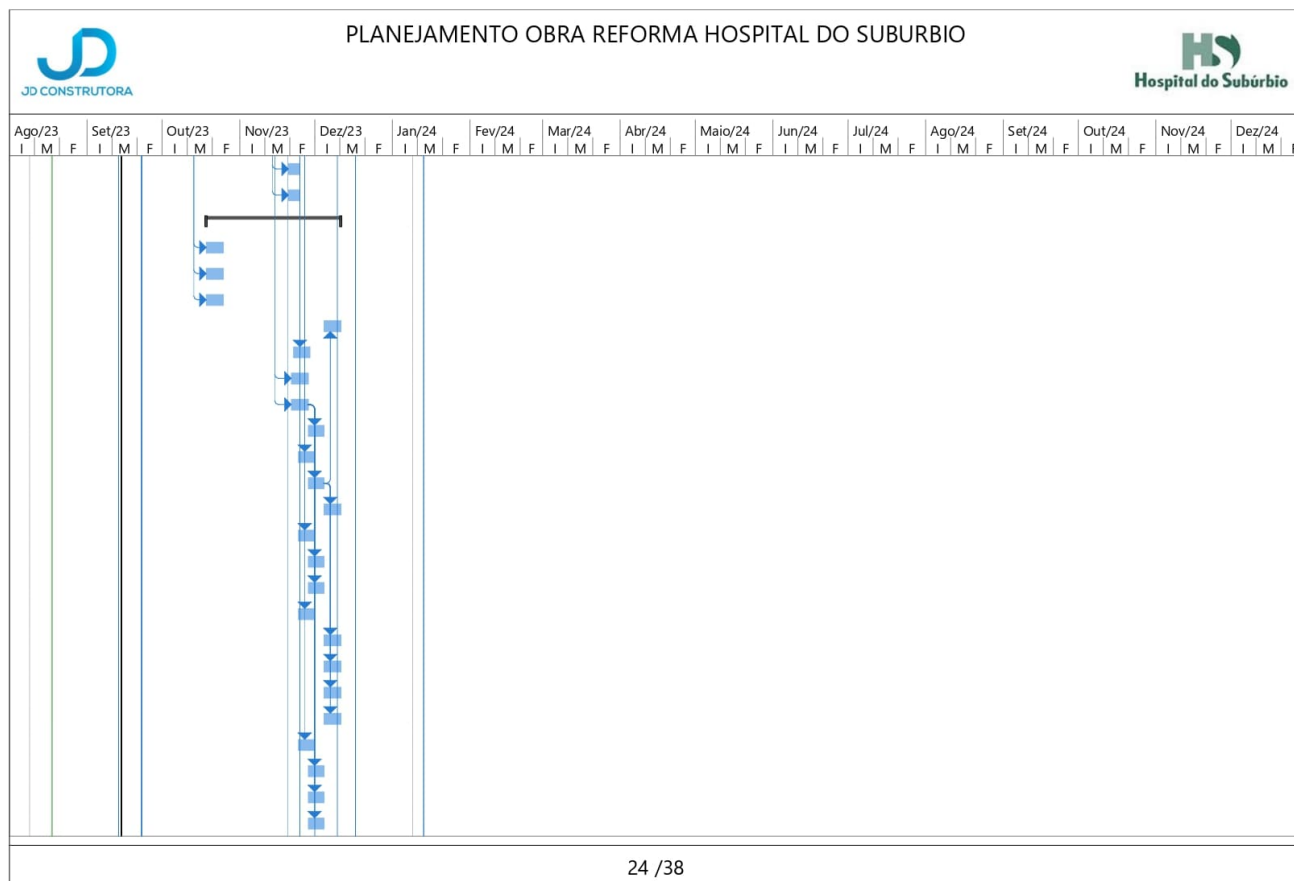


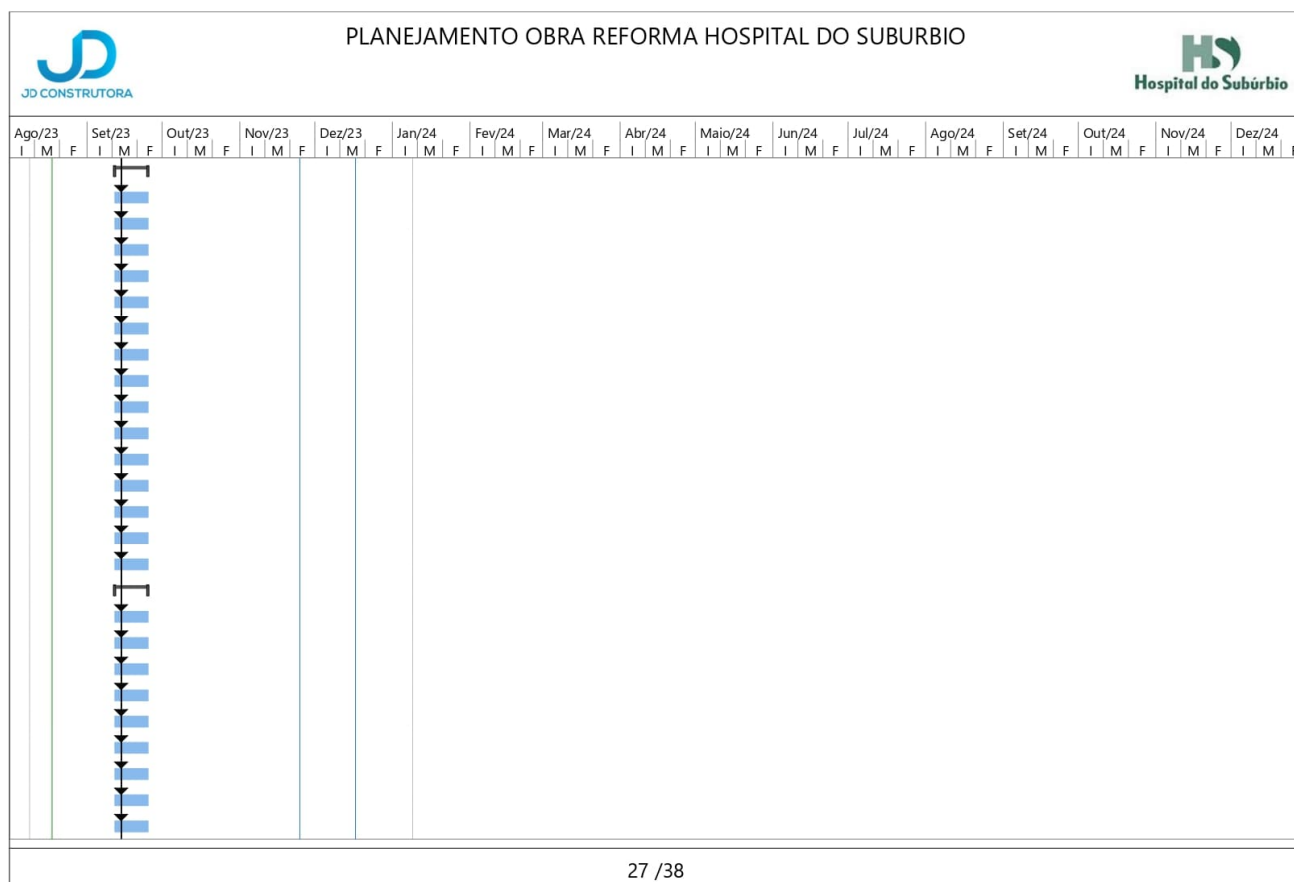
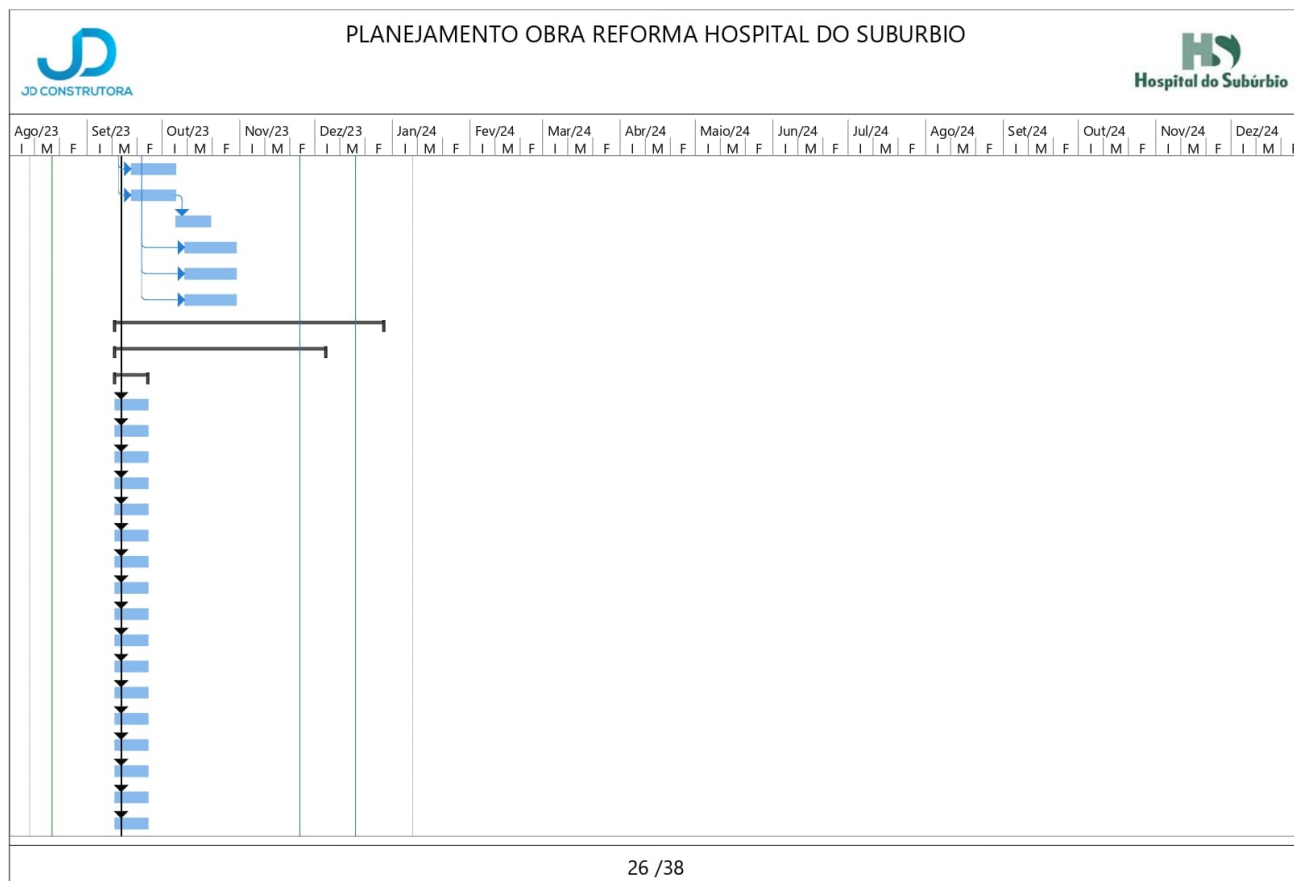


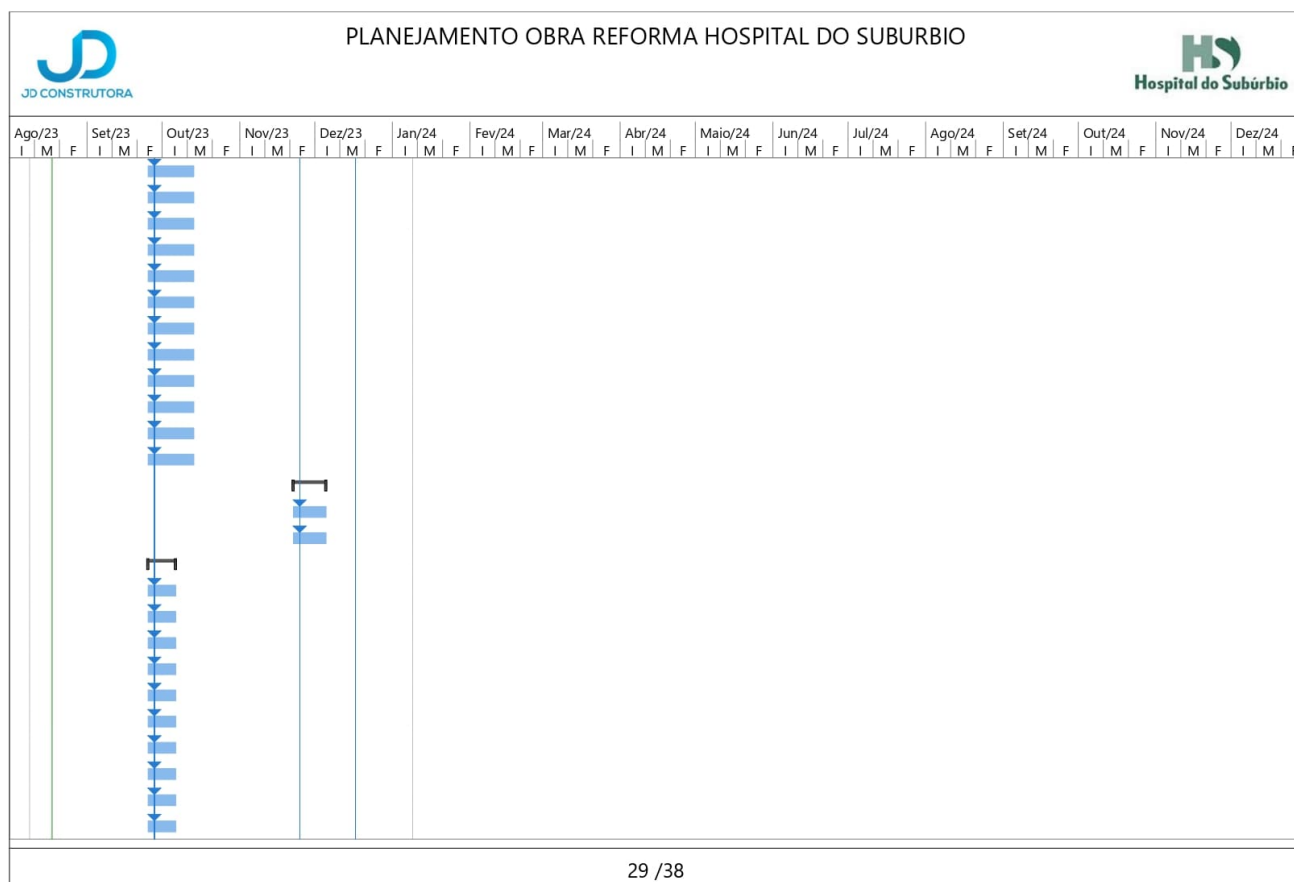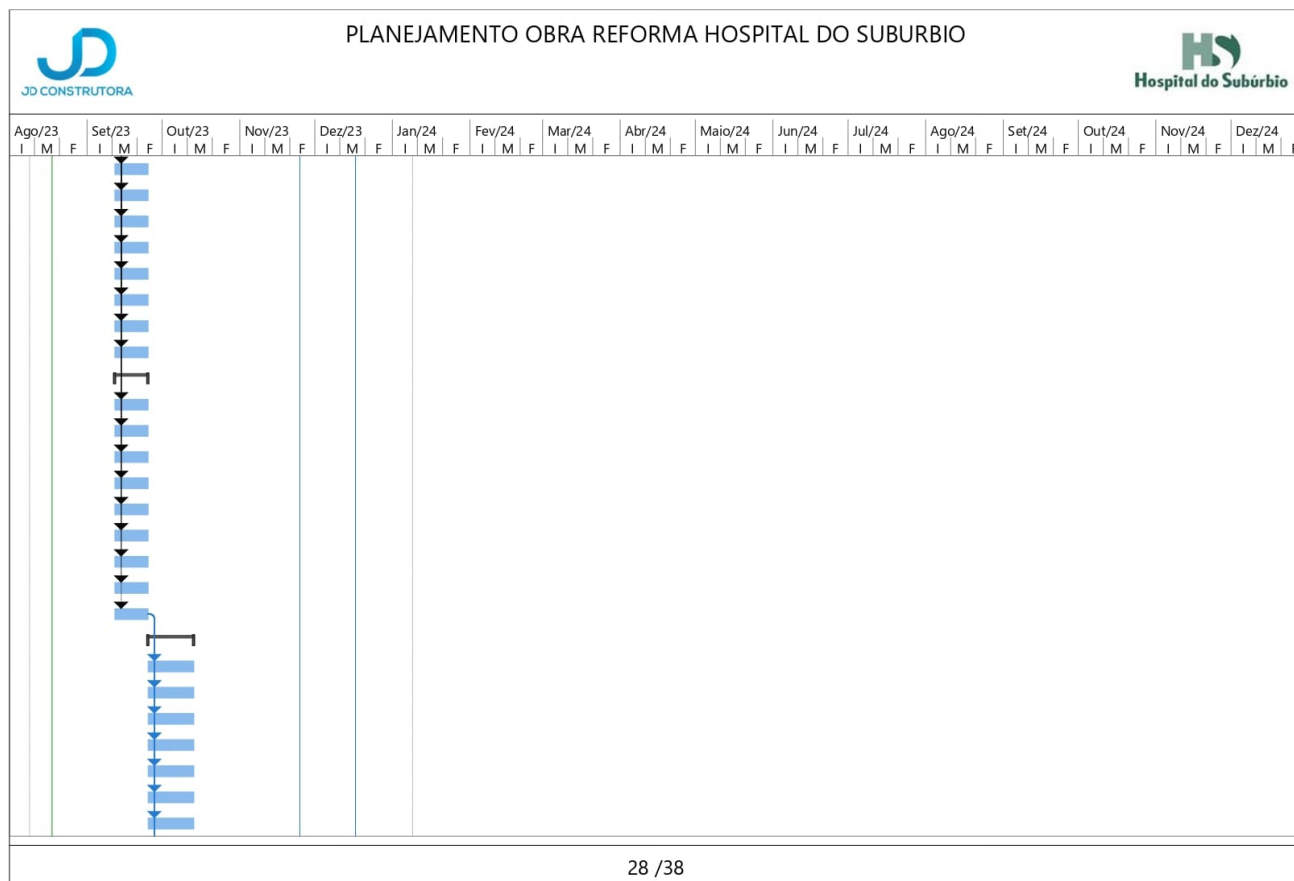


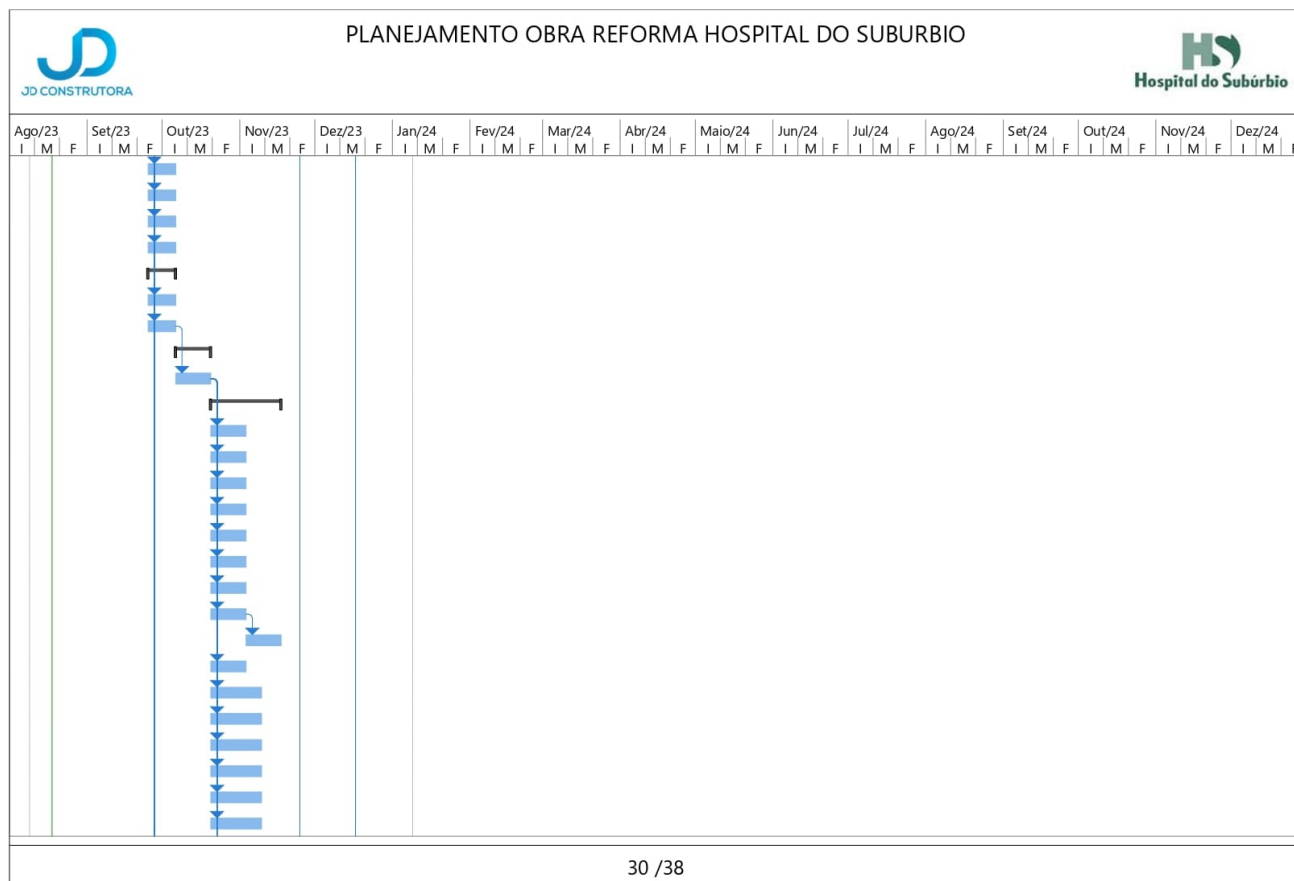



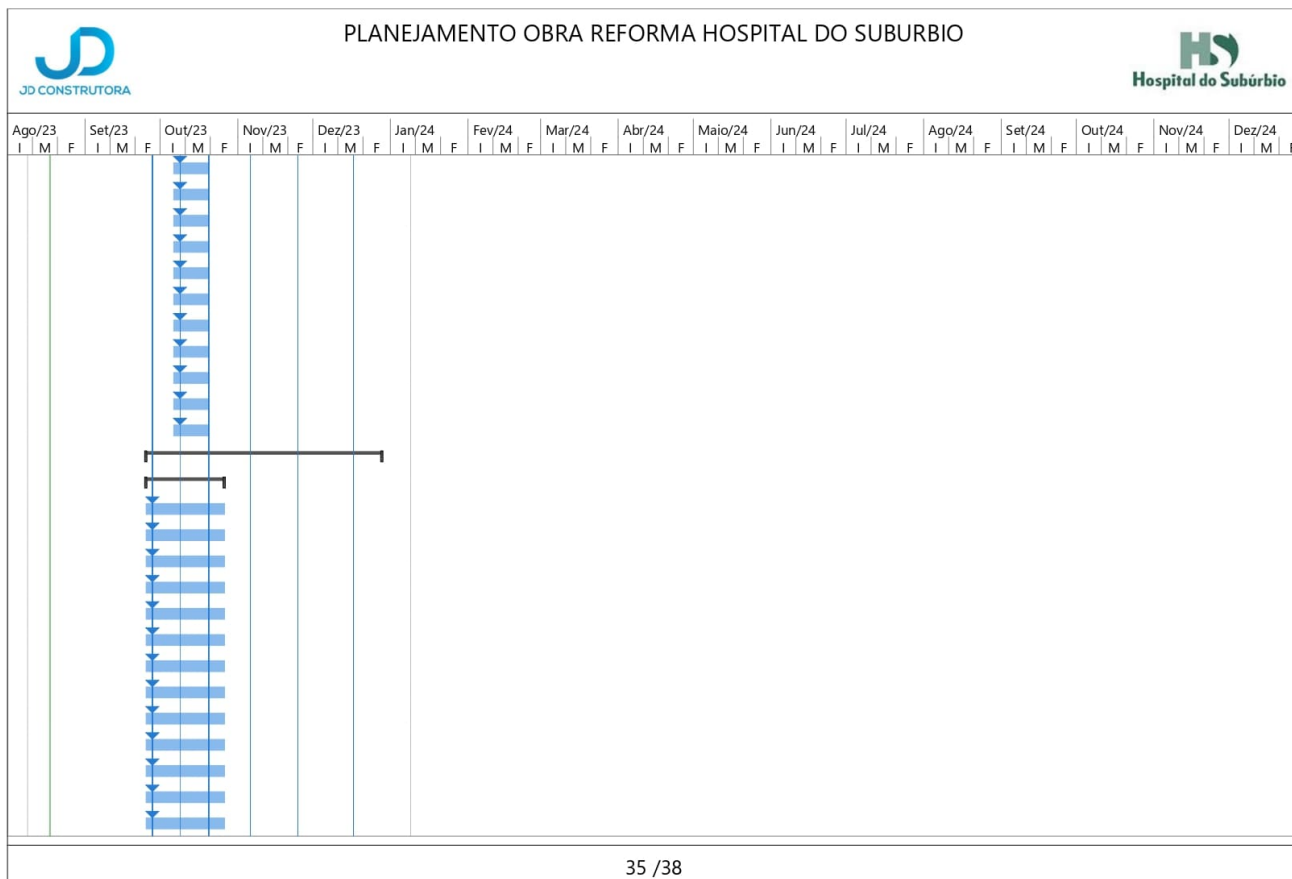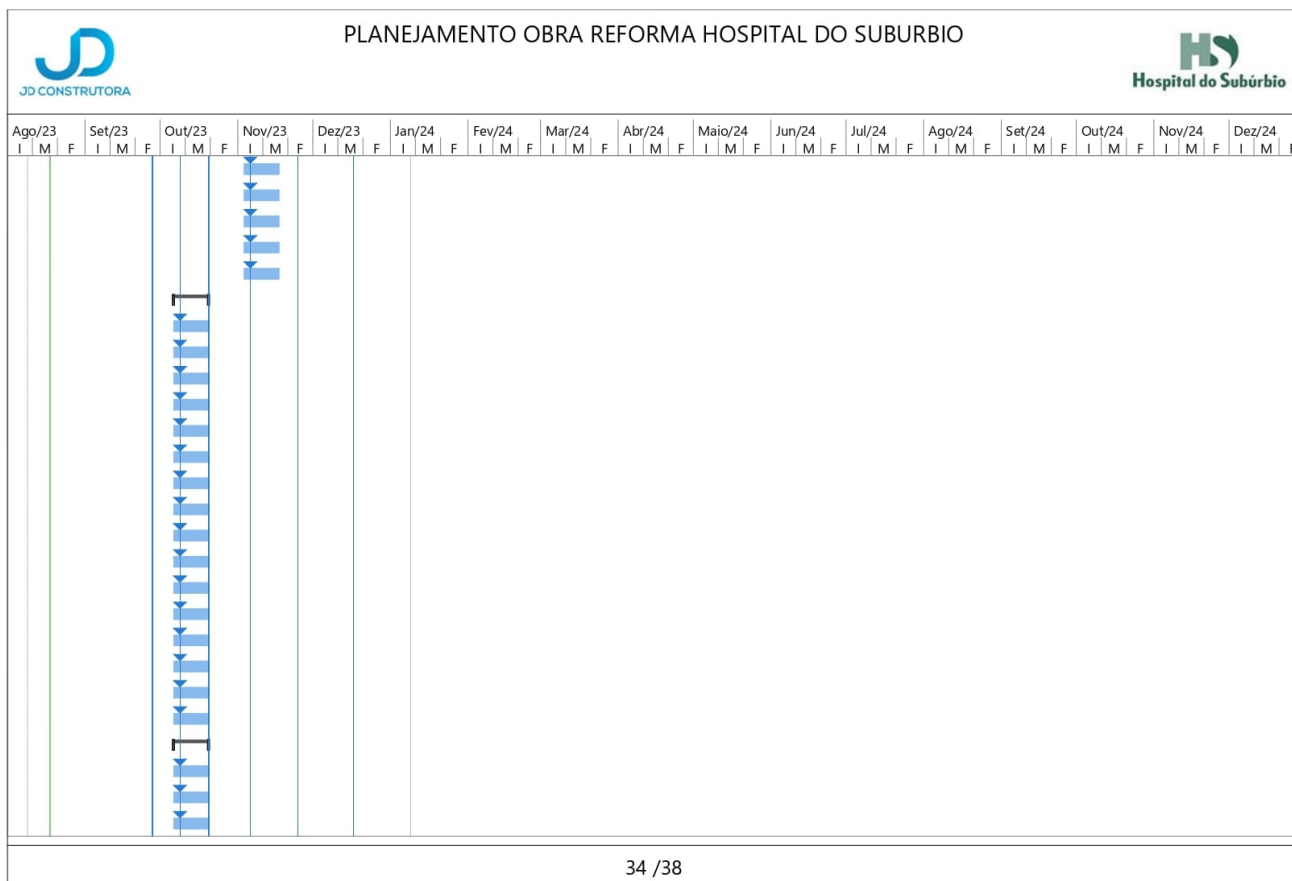

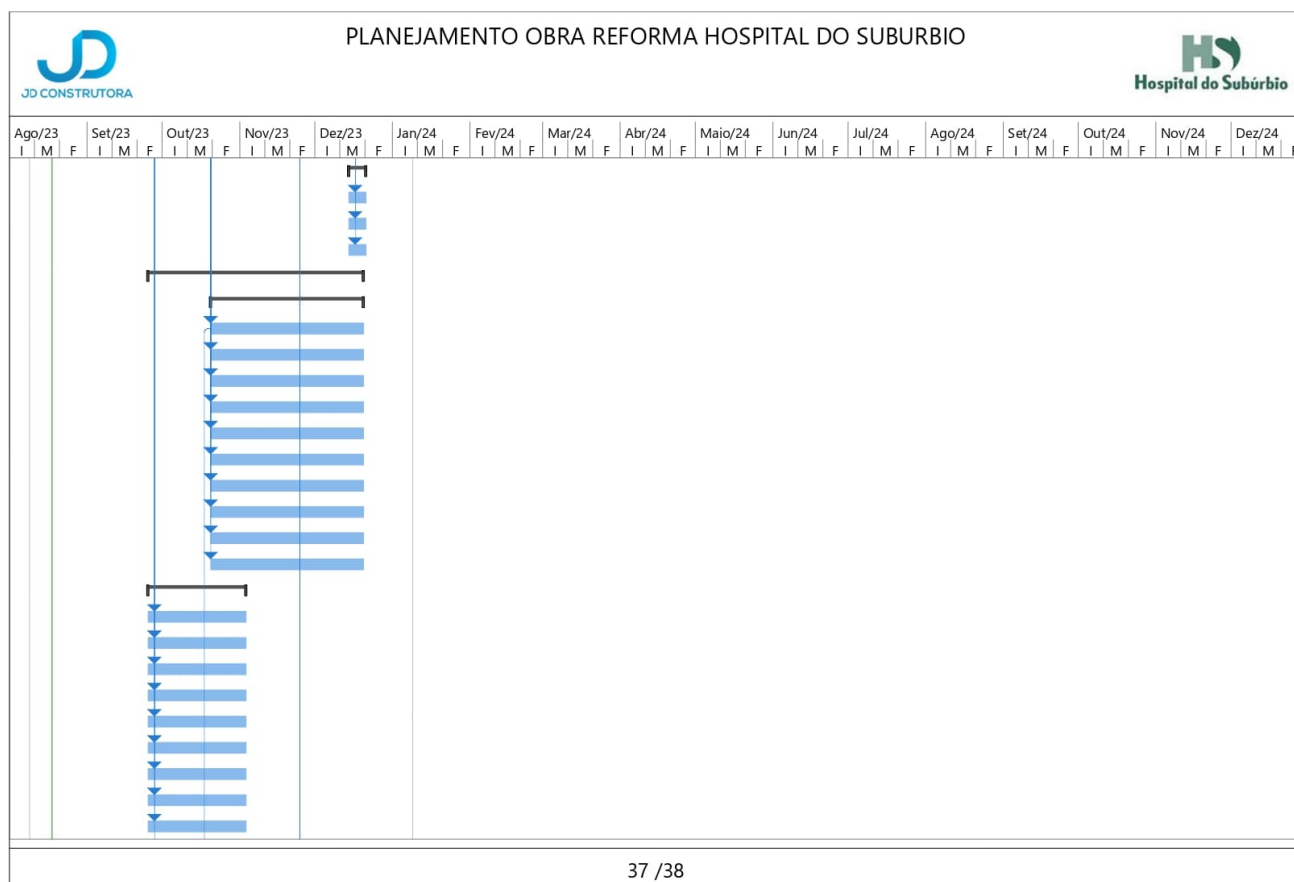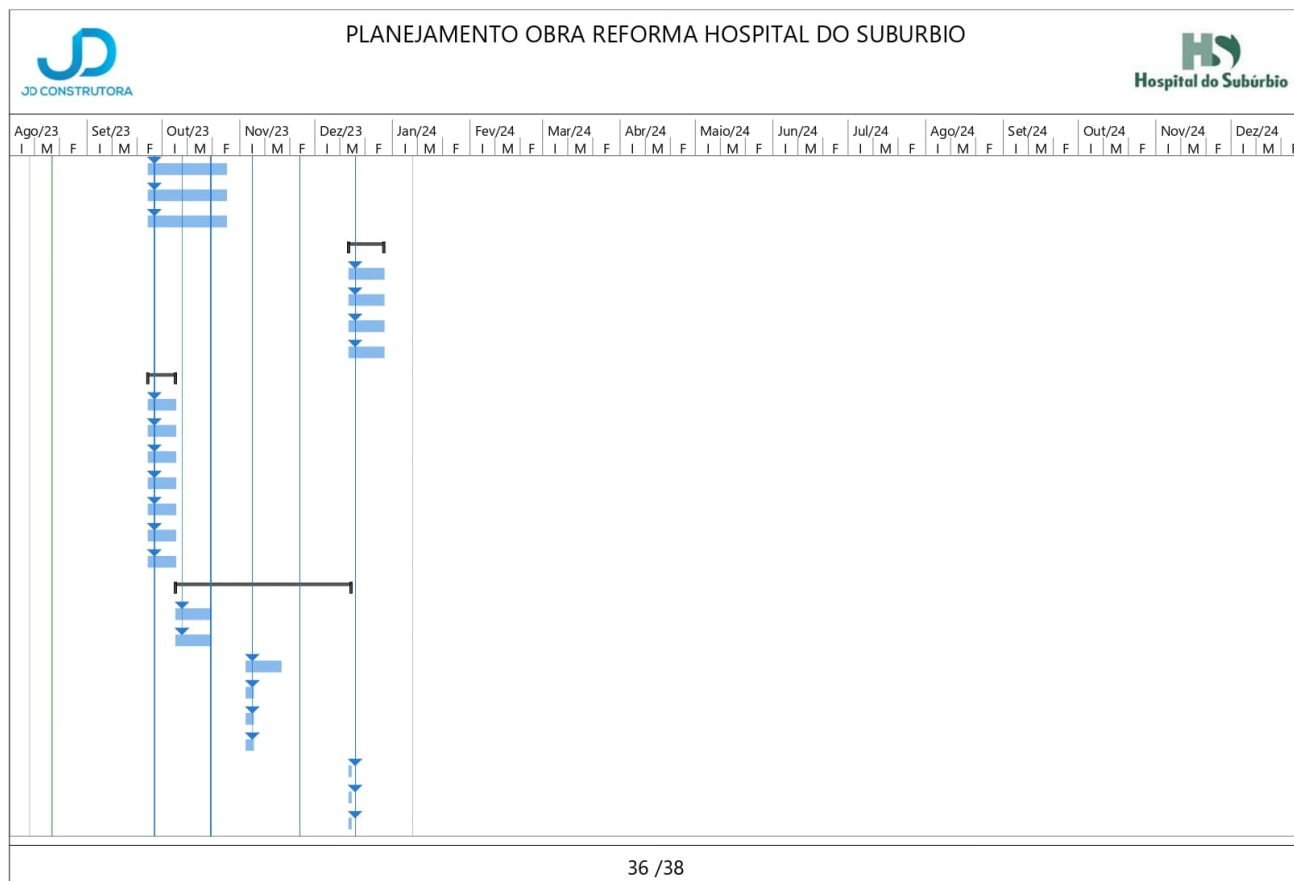

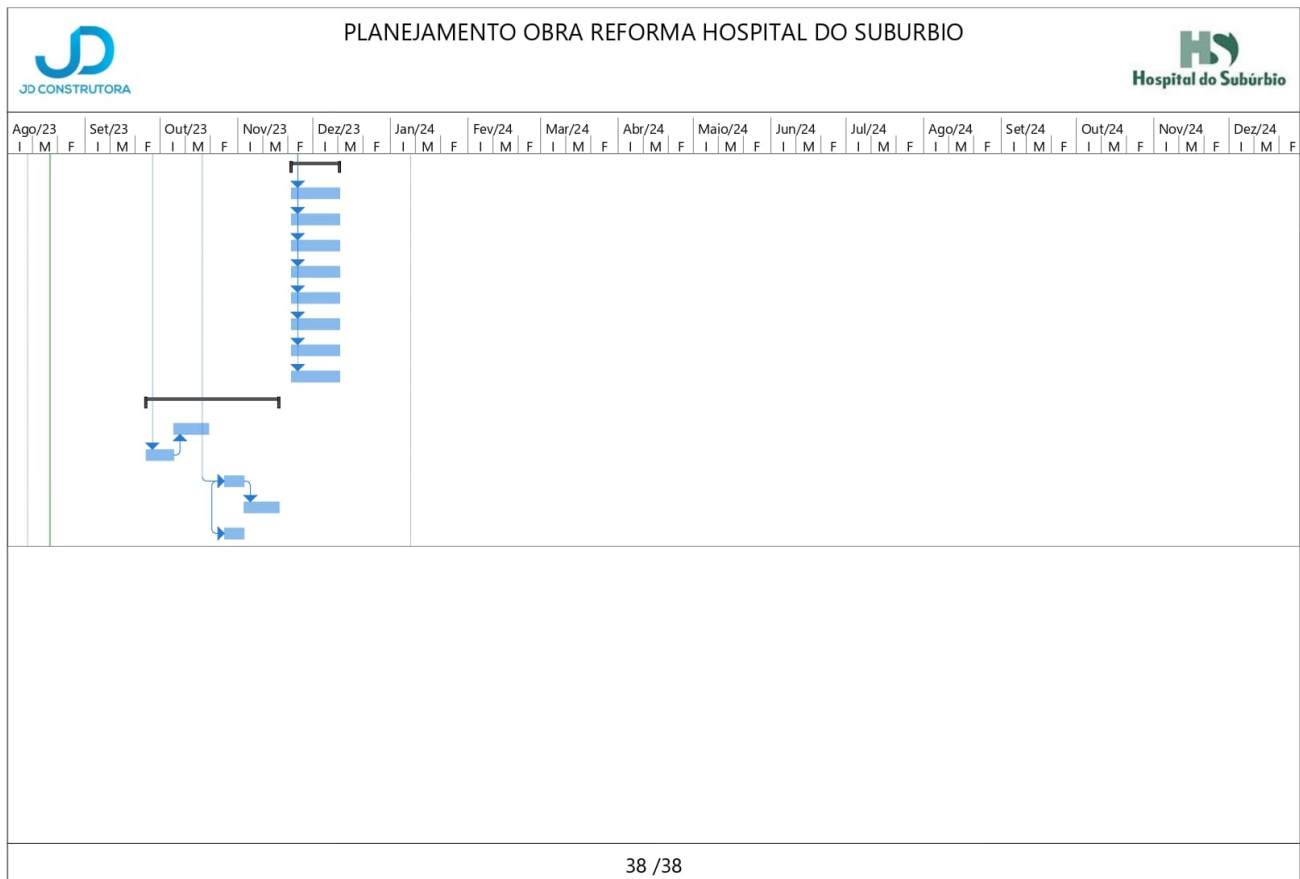

Documento assinado eletronicamente por **Jorge Antonio Duarte Oliveira, Representante Legal da Empresa**, em 04/01/2024, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo de Oliveira Costa, Presidente**, em 05/01/2024, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marko Svec Silva, Diretor**, em 08/01/2024, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Silva de Carvalho Santana, Secretário(a) Estadual de Saúde**, em 16/01/2024, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00081763530** e o código CRC **9D043C00**.
